Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Entrega N.º 2 — Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Federico Dante Barranco

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Coordinadora de Cátedra

Prof. Gabriela Martínez

Profesor

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor — Comisión 2

Prof. Eduardo Daniel Martínez

4 de octubre de 2026

Índice

Introducción 3

Objetivos 3

Desarrollo 3

- Consigna 1 – Análisis FODA del proyecto 3
- Consigna 2 – Objetivos y metas 4
- Consigna 3 – Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 5

Conclusión 7

Declaración de transparencia en el uso de IA 7

Referencias 7

Introducción

Esta es la segunda entrega del TPI de Organización Empresarial. Sigo con el mismo caso de la Entrega 1, Patagonia Argentina, y con la mejora que había propuesto: el buscador del sitio patagonia-ar.com. En esta entrega la bajo a un proyecto concreto, que es en el que estamos trabajando ahora en el equipo de desarrollo: sumarle inteligencia artificial al buscador para que entienda búsquedas escritas en español como habla la gente. Por ejemplo, si alguien escribe "algo para la cabeza", que le muestre gorros, gorras, pañuelos y, por último, anteojos.

Hoy el sitio, que está hecho en Shopify, usa la app Boost en su plan Basic y en su versión anterior (Former). Para sumar IA hay dos caminos: probar Doofinder, que es otro buscador con IA, o quedarnos con Boost, actualizándolo a la versión Turbo y agregando sus funciones de IA. Lo que más se perfila es la segunda opción, aunque la migración a Turbo es la parte más difícil del proyecto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Hacer un análisis FODA del proyecto de software.
- Definir el objetivo general del proyecto y metas que se puedan medir.
- Planificar las tareas en un diagrama de Gantt, con plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1 – Análisis FODA del proyecto

Para el FODA tomé como equipo técnico al equipo de desarrollo que trabaja en el e-commerce de la marca. Somos tres personas: yo me encargo de la relación con el cliente y de investigar la documentación de las opciones posibles; un desarrollador interno ve los temas técnicos; y un desarrollador externo, tercerizado, hace la migración junto con el soporte de la app. Además está nuestro jefe, que responde consultas puntuales y se ocupa de la facturación al cliente.

Matriz FODA - Buscador con IA para patagonia-ar.com

Internas	*Externas*
FORTALEZAS - Ya conocemos Boost y el theme del sitio porque trabajamos con la app hace tiempo. - Roles claros: uno con el cliente y la investigación, otro técnico y un desarrollador externo para la migración. - Probamos todo en un theme oculto antes de pasar a producción. - Contacto directo con el cliente para decidir rápido.	**OPORTUNIDADES** - Hay buscadores con IA (Boost AI Search y Doofinder) que entienden búsquedas en español natural. - La versión Turbo de Boost trae mejoras de velocidad, recomendaciones y bundles. - Fechas de mucho tráfico (CyberMonday, Black Friday, fiestas) donde un buen buscador vende más. - Los clientes cada vez buscan como hablan ("algo para la lluvia").
DEBILIDADES - Somos solo 3 personas y la migración depende mucho del desarrollador tercerizado. - Poca experiencia con IA aplicada a buscadores. - El theme tiene muchos desarrollos propios que se pueden romper al pasar a Turbo. - Para algunos problemas dependemos del soporte de la app.	**AMENAZAS** - Competencia (The North Face, Columbia, Ansilta, Montagne) con sitios cada vez mejores. - Los planes de las apps se pagan en dólares y el tipo de cambio sube los costos. - Cambios de precios o condiciones de Boost, Doofinder o Shopify. - Conflictos con otras apps del sitio (por ejemplo la de descuentos) al actualizar.

Figura 1. Matriz FODA del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Lo que más pesa del análisis es que la migración a Turbo es complicada y que dependemos bastante del desarrollador externo. Por eso en la planificación dejamos tiempo para mapear los cambios antes de migrar y para revisar todo en un theme oculto antes de pasar a producción.

Consigna 2 – Objetivos y metas

Objetivo general: implementar en patagonia-ar.com, antes de fin de octubre de 2026, un buscador con inteligencia artificial que entienda búsquedas en español natural, evaluando Doofinder frente a la actualización de Boost a la versión Turbo con IA, para que los clientes encuentren más rápido lo que buscan y se venda más.

Metas:

- De una lista de 20 búsquedas de prueba escritas como habla la gente (por ejemplo "algo para la cabeza" o "campera para la nieve"), al menos 16 tienen que mostrar productos correctos en los primeros resultados.
- Las páginas de búsqueda y de colecciones tienen que cargar al menos un 20% más rápido que con la versión actual de Boost.
- Pasar a producción antes del 31/10/2026, para llegar a CyberMonday y Black Friday con el buscador nuevo, sin perder ninguna de las funciones que hoy tiene.

Consigna 3 – Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

El proyecto arrancó a mediados de septiembre y va del 14/09 al 19/10/2026. Las tareas son en orden, cada una empieza cuando termina la anterior. Al momento de esta entrega estamos en la etapa de pruebas, corrigiendo los errores que encontramos en el theme oculto. Una regla que tenemos en el equipo es no pasar nunca a producción un viernes, por eso el pase queda para el jueves 15/10.

- Análisis: 1. Relevamiento con el cliente, 14/09 al 15/09 (Fede). 2. Investigar Doofinder vs. Boost Turbo con IA, 16/09 al 18/09, depende de la 1 (Fede y Dev interno). 3. Presentar las opciones y que el cliente decida, 21/09 al 22/09, depende de la 2 (Fede y cliente).
- Diseño: 4. Mapear los cambios y riesgos de pasar a Turbo, 23/09 al 24/09, depende de la 3 (Fede y Dev interno).
- Codificación: 5. Migración a Turbo y configuración de la IA, 25/09 al 01/10, depende de la 4 (Dev externo).
- Pruebas: 6. Revisión en el theme oculto, 02/10 al 05/10, depende de la 5 (Fede y Dev interno). 7. Corrección de errores, 06/10 al 09/10, depende de la 6 (Dev externo). 8. Aprobación del cliente, 13/10 al 14/10, depende de la 7 (cliente).
- Implementación: 9. Pase a producción, 15/10, depende de la 8 (Dev interno). 10. Seguimiento y cierre, 16/10 al 19/10, depende de la 9 (Fede y jefe).

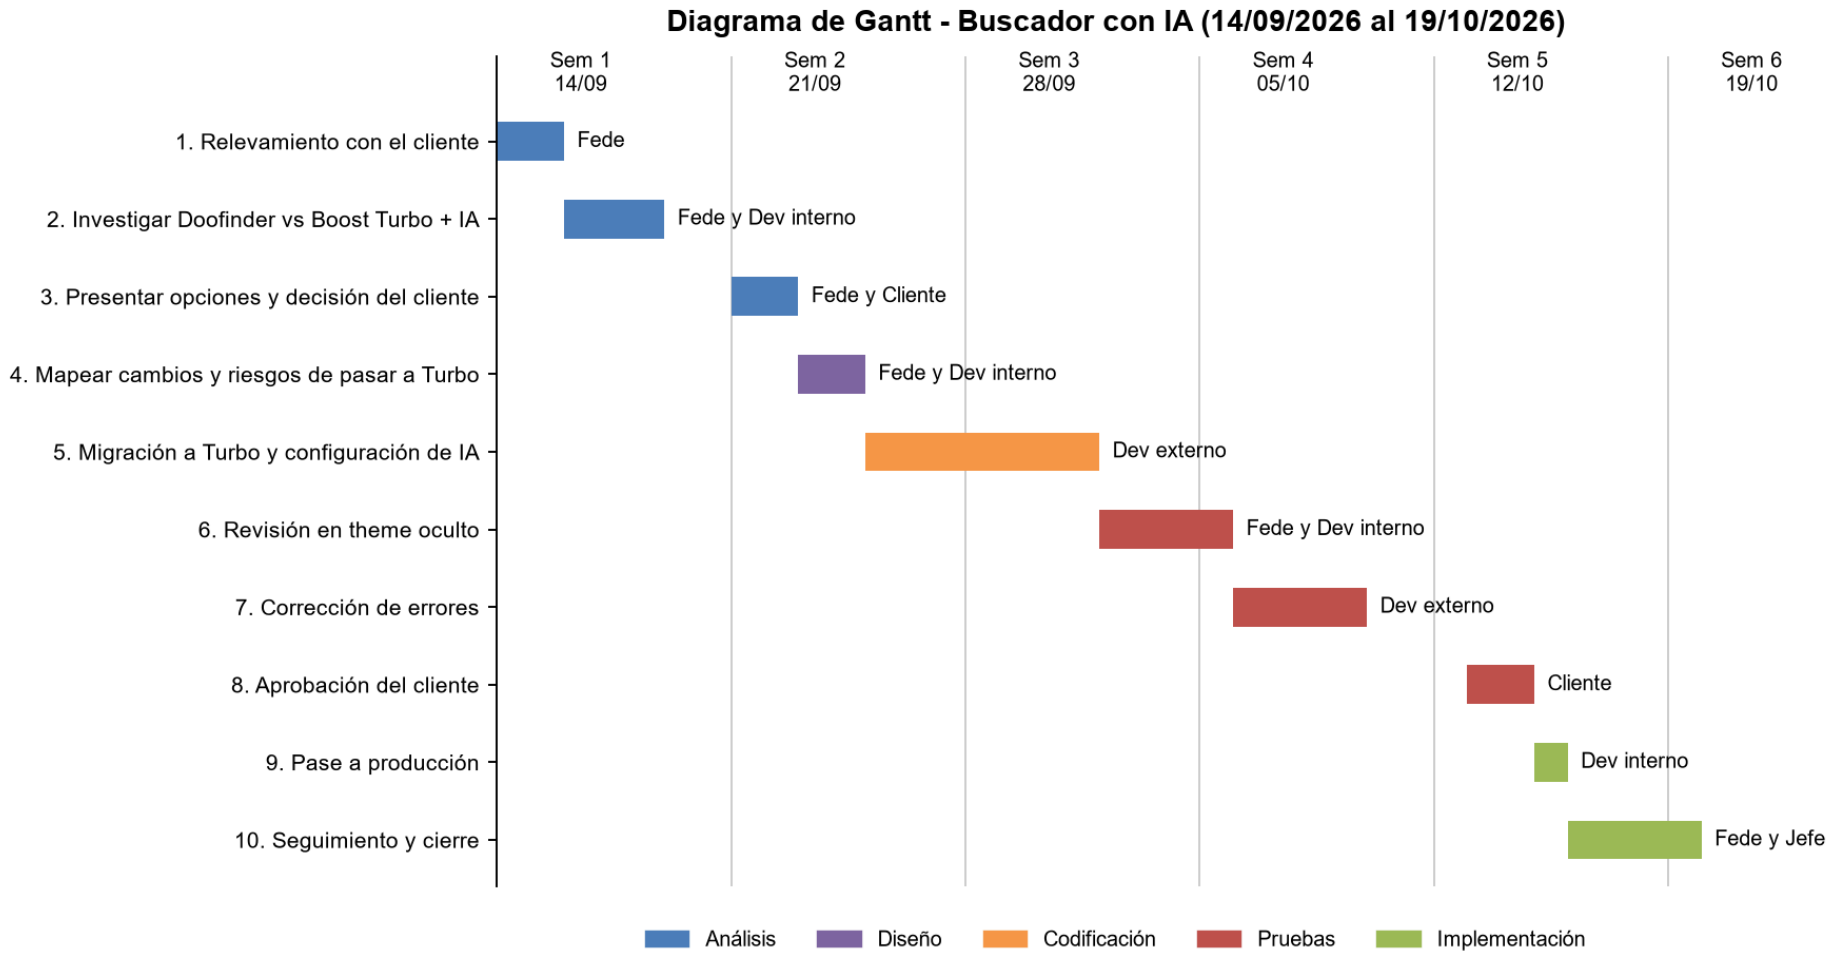


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Conclusión

Hacer el FODA me sirvió para ver que el proyecto es viable, pero que el riesgo más grande no es la IA en sí, sino la migración a Turbo y depender de una persona externa para hacerla. Definir metas con números me obliga a poder comprobar después si el buscador realmente mejoró, y el Gantt muestra que llegamos bien a las fechas fuertes de noviembre si se respetan los tiempos de cada etapa.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Usé Claude para ordenar la información del proyecto, darle forma a la redacción y armar los gráficos del FODA y del Gantt a partir de lo que le conté. El proyecto es real: es el que estamos llevando adelante en mi trabajo, y los datos del equipo, las opciones que evaluamos y las etapas salen de ahí.

Referencias

Boost Commerce (s. f.). Boost AI Search & Discovery vs. Doofinder. https://boostcommerce.net/platform/boost-doofinder

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 4 – Tema 2: Herramientas de Administración. UTN – TUPaD.

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos. Bubok Publishing S.L.
